

ROMA CONSTRUTORA LTDA – ME
CNPJ: 21.725.552/0001-37



PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.04.18.1

À Prefeitura Municipal De Barbalha – Ceará
Comissão Permanente De Licitação

DESCCLASSIFICADA

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.S. a nossa proposta de preços para *Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de recomposição de pavimentação em pedra tosca e paralelepípedo em diversas localidades pertencentes ao Município de Barbalha/CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório*, objeto do Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.04.18.1, pelo preço global de R\$ 242.507,02 (Duzentos e Quarenta e Dois Mil Quinhentos e Sete reais e Dois centavos), com prazo de execução de 9 (nove) Meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.04.18.1, nos comprometemos a assinar o termo de contrato no prazo determinado no instrumento de convocação, indicado para esse fim, o Senhor Roberto Antônio de Castro Macêdo, portador da cédula de identidade de nº 0327001720075, expedida pela SSP/MA e do CPF Nº 249.129.563-68, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta de preços será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega dos envelopes indicados sobre as letras “A” e “B”, contendo respectivamente as documentações de Habilitação e Propostas de Preços.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação bem como seus anexos.

ROMA CONSTRUTORA LTDA – ME
RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA, Nº 276 - ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA – CE
CNPJ: 21.725.552/0001-37
CONTA CORRENTE: 17418-7, - AGÊNCIA: 0231, BNB.

Barbalha – CE, 05 de maio de 2017.

ROMA CONSTRUTORA LTDA ME
ROBERTO ANTÔNIO DE CASTRO MACÊDO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 249.129.563-68


JARBAS DELMOUTEZ RAMALHO SAMPAIO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 5286

Jarbas Delmoutez Ramalho Sampaio
Engenheiro Civil


CPF: 127.401.964-00

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	Recomposição de pavimentação em pedra tosca e paralelepípedo em diversas localidades pertencentes ao Município de Barbalha/CE	DATA :	04/05/2017		BDI :	24,11%
	ENDEREÇO:	Município de Barbalha/CE	FONTE	VERBAO	HORA	MESES	DATA REF.
	CLIENTE:	Município de Barbalha/CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
			SINAPI	2017/01 COM DESONERAÇÃO	88,66%	50,66%	02/2017
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	615,84	0,25
2	RECOMPOSIÇÃO	182.301,00	75,17
3	LIMPEZA FINAL	12.480,00	5,15
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	47.110,18	19,43
Valor total do Orçamento		242.507,02	100,00

Duzentos e Quarenta e Dois Mil Quinhentos e Sete reais e Dois centavos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: Recomposição de pavimentação em pedra tosca e paralelepípedo em diversas localidades pertencentes ao Município de Barbalha/CE

ENDEREÇO: Município de Barbalha/CE

CLIENTE: Município de Barbalha/CE

DATA : 04/05/2017

BDI : 24,11%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
SINAPI	2017/01 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	88,66%	50,66%	02/2017
		-	-	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						615,84
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	102,64	615,84
2	RECOMPOSIÇÃO						182.301,00
2.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	2.600,00	9,44	24.544,00
2.2	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	8.500,00	14,75	125.375,00
2.3	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.400,00	23,13	32.382,00
3	LIMPEZA FINAL						12.480,00
3.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	8.000,00	1,56	12.480,00

Valor Orçamento (A): 195.396,84

Valor Encargos (B): 56.885,68

Total sem Encargos (A - B): 138.511,16

Valor BDI (C): 47.110,18

Valor BDI Diferenciado (D): 0,00

Valor Total (A + C + D): 242.507,02

Duzentos e Quarenta e Dois Mil Quinhentos e Sete reais e Dois centavos



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Recomposição de pavimentação em pedra tosca e paralelepípedo em diversas localidades pertencentes ao Município de Barbalha/CE

ENDEREÇO: Município de Barbalha/CE

CLIENTE: Município de Barbalha/CE

DATA: 04/05/2017 BDI: 24,11%


FORTE	VERBAÇÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
SINAPI	2017/01 COM DESONERAÇÃO	88,66%	50,66%	02/2017
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	MÊS7	MÊS8	MÊS9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	615,84	100,00 % 615,84								
2	RECOMPOSIÇÃO	182.301,00	10,00 % 18.230,10	10,00 % 18.230,10	10,00 % 18.230,10	10,00 % 18.230,10	10,00 % 18.230,10	10,00 % 18.230,10	10,00 % 18.230,10	10,00 % 18.230,10	20,00 % 36.460,20
3	LIMPEZA FINAL	12.480,00	10,00 % 1.248,00	10,00 % 1.248,00	10,00 % 1.248,00	10,00 % 1.248,00	10,00 % 1.248,00	10,00 % 1.248,00	10,00 % 1.248,00	10,00 % 1.248,00	20,00 % 2.496,00
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	47.110,18	10,29 % 4.847,64	9,97 % 4.696,88	9,97 % 4.696,88	9,97 % 4.696,88	9,97 % 4.696,88	9,97 % 4.696,88	9,97 % 4.696,88	9,97 % 4.696,88	19,92 % 9.384,38
		242.507,02	24.941,58	24.174,98	24.174,98	24.174,98	24.174,98	24.174,98	24.174,98	24.174,98	48.340,58
			24.941,58	49.116,56	73.291,54	97.466,52	121.641,50	145.816,48	169.991,46	194.166,44	242.507,02

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	615,84	100,00 % 615,84
2	RECOMPOSIÇÃO	182.301,00	100,00 % 182.301,00
3	LIMPEZA FINAL	12.480,00	100,00 % 12.480,00
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	47.110,18	100,00 % 47.110,18
		242.507,02	242.507,02



(Handwritten signatures in blue ink)

COMPOSIÇÃO DO BDI						
	OBRA:	Recomposição de pavimentação em pedra tosca e paralelepípedo em diversas localidades pertencentes ao Município de Barbalha/CE	DATA :	04/05/2017	BDI :	24,11%
	ENDEREÇO:	Município de Barbalha/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	Município de Barbalha/CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		SINAPI	2017/01 COM DESONERAÇÃO	88,66%	50,66%	02/2017
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	3,31
	TOTAL	3,71

Despesas Indiretas		
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
AC	Administração central	4,01
	TOTAL	5,68


I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	3,50
	PIS	0,65
	CPRB (Adotar 4,50%, quando houver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	11,65



BDI = 24,11%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	Recomposição de pavimentação em pedra tosca e paralelepípedo em diversas localidades pertencentes ao Município de Barbalha/CE	DATA :	04/05/2017	BDI :	24,11%	
	ENDEREÇO:	Município de Barbalha/CE	PONTE	VERGÃO	HORA	MES	DATA REF.
	CLIENTE:	Município de Barbalha/CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
			SINAPI	2017/01 COM DESONERAÇÃO	88,66%	50,66%	02/2017
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feridos	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,92	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,65	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	10,42	7,96
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	46,45	17,71

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35	4,85
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,11
C3	Férias Indenizadas	3,56	2,72
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84	3,69
C5	Indenização Adicional	0,53	0,41
	TOTAL	15,43	11,78

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80	2,98
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53	0,41
	TOTAL	8,33	3,39

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

A + B + C + D



Handwritten signatures and initials.

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	Recomposição de pavimentação em pedra tosca e paralelepípedo em diversas localidades pertencentes ao Município de Barbalha/CE	DATA :	04/05/2017	BDI :	24,11%
ENDEREÇO:	Município de Barbalha/CE	FONTE	VERBAO	HORA	MES
CLIENTE:	Município de Barbalha/CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-
		SINAPI	201701 COM DESONERAÇÃO	88,66%	50,66%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-
					DATA REF.
					03/2016
					02/2017

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

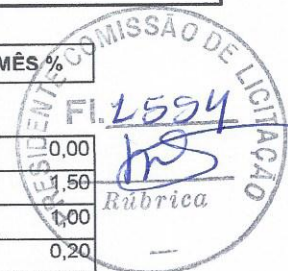
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feridos	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,69
B4	13º Salário	10,99	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,67	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	11,61	8,80
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	47,75	18,55


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,26	5,50
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17	0,13
C3	Férias Indenizadas	2,44	1,85
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,00	3,79
C5	Indenização Adicional	0,61	0,46
	TOTAL	15,48	11,73

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,02	3,12
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,61	0,46
	TOTAL	8,63	3,58

Horista = 88,66%
Mensalista = 50,66%

A + B + C + D



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	Recomposição de pavimentação em pedra tosca e paralelepípedo em diversas localidades pertencentes ao Município de Barbalha/CE	DATA :	04/05/2017	BDI :	24,11%	
	ENDEREÇO:	Município de Barbalha/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	CLIENTE:	Município de Barbalha/CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
			SINAPI	2017/01 COM DESONERAÇÃO	88,66%	50,66%	02/2017
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,000000	7,30	14,60
Total:					14,60

MATERIAIS

I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,020000	23,60	24,07
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,000000	9,60	9,60
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,500000	11,83	53,24
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,150000	7,52	1,13
Total:					88,04	



Valor Simples: 95,86
Encargos Embutidos (87.01%): 6,78
Valor com Encargos: 102,64
Total Geral: 102,64

2.1. C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,400000	10,77	4,31
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,300000	7,30	2,19
Total:					6,50

MATERIAIS

I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,080000	36,80	2,94
Total:					2,94	

Valor Simples: 6,42
Encargos Embutidos (87.01%): 3,02
Valor com Encargos: 9,44
Total Geral: 9,44


2.2. C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,500000	10,77	5,38
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,450000	7,30	3,28
Total:					8,67

MATERIAIS


I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,008800	40,00	0,35
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,120000	36,80	4,42
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,280000	0,40	1,31
Total:					6,08	

Valor Simples: 10,72
Encargos Embutidos (87.01%): 4,03
Valor com Encargos: 14,75
Total Geral: 14,75




2.3. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
-------------	-------	---------	--------------	-------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	Recomposição de pavimentação em pedra tosca e paralelepípedo em diversas localidades pertencentes ao Município de Barbalha/CE	DATA :	04/05/2017	BDI :	24,11%	
	ENDEREÇO:	Município de Barbalha/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	CLIENTE:	Município de Barbalha/CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
			SINAPI	2017/01 COM DESONERAÇÃO	88,66%	50,66%	02/2017
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,900000	10,77	9,69
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,050000	7,30	7,66
					Total:	17,36

MATERIAIS

I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,007200	40,00	0,29
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,120000	36,80	4,42
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,680000	0,40	1,07
					Total:	5,78



Valor Simples:	15,06
Encargos Embutidos (87.01%):	8,07
Valor com Encargos:	23,13
Total Geral:	23,13

U.1. 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coficiente	Preço	Total	
00000003 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	L	0,050000	3,32	0,17	
					Total:	0,17

SERVICOS DIVERSOS

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,140000	9,94	1,39
					Total:	1,39

Valor Simples:	1,13
Encargos Embutidos (88.66%):	0,43
Valor com Encargos:	1,56
Total Geral:	1,56



DESCLASSIFICADA

PROPOSTA DE PREÇOS



CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR

AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE: (85) 3261 0915
CNPJ 07.195.191/0001-33 - CGF 06.002.744-4
CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - Ceará

CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Fortaleza-CE, 05 de maio de 2017.

À
Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Barbalha
Barbalha-CE.

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 2017.04.18.1

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 2017.04.18.1, pelo preço global de **R\$ 272.295,93 (Duzentos e setenta e dois mil, duzentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos)**, com prazo de execução de 09 (nove) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Igo Proença Alencar, Carteira de Identidade n°. 96006001917 SSP-CE expedida em 16/01/1996, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF n° 806.191.503-00, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,


CORAL - Const. Rodovalho Alencar Ltda.


Eng° Civil Igo Proença Alencar
Diretor Técnico - CREA/CE 14828-D


CORAL - Const. Rodovalho Alencar Ltda.


Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Eng° Civil - CREA - CE 8996 - D
Responsável Técnico



CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

AV. SEN. VIRGILIO TAVORA, 1701 - SALA 408 - FONE/FAX: (85) 3261.0915
CNPJ 07.195.191/0001-33 - CGF 06.002.744-4
CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - CE



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO

MUNICÍPIO: BARBALHA - CE

DATA: 05/05/2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	128,31	769,86
SUB TOTAL						769,86
2.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
2.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	2.600,00	10,52	27.352,00
2.2	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M2	8.500,00	16,43	139.655,00
2.3	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO	M2	1.400,00	26,93	37.702,00
SUB TOTAL						204.709,00
3.0		LIMPEZA FINAL				
3.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	8.000,00	1,74	13.920,00
SUB TOTAL						13.920,00
TOTAL PARCIAL						219.398,86
BDI 24,11%						52.897,07
VALOR TOTAL						272.295,93

IMPORTA A PRESENTE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA NO VALOR DE R\$ 272.295,93

DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

CORAL - Const. Rodovalho Alencar Ltda.

Eng.º Civil Igo Proença Alencar
Diretor Técnico - CREAJ/CE 14826-D

CORAL - Const. Rodovalho Alencar Ltda.

Paulo Adriano da Almeida Magalhães
Eng.º Civil - CREAJ/CE 8966 - D
Responsável Técnico



CONSTRUTORA RODOLVALHO ALENCAR LTDA

AV. SEN. VIRGILIO TAVORA, 1701 - SALA 408 - FONE/FAX: (85) 3261.0915
CNPJ 07.195.191/0001-33 - CGF 06.002.744-4
CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO
MUNICÍPIO: BARBALHA - CE

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09			
				Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%		
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES																					
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	769,86	769,86	100,00%																		
2.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VÁRIO																					
2.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SIREJUNTAMENTO	27.352,00	2.735,20	10,00%	2.735,20	10,00%	2.735,20	10,00%	2.735,20	10,00%	2.735,20	10,00%	2.735,20	10,00%	2.735,20	10,00%	2.735,20	10,00%	2.735,20	10,00%		
2.2	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CIREJUNTAMENTO	139.655,00	13.965,50	10,00%	13.965,50	10,00%	13.965,50	10,00%	13.965,50	10,00%	13.965,50	10,00%	13.965,50	10,00%	13.965,50	10,00%	13.965,50	10,00%	13.965,50	10,00%		
2.3	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CIREJUNTAMENTO	37.702,00	3.770,20	10,00%	3.770,20	10,00%	3.770,20	10,00%	3.770,20	10,00%	3.770,20	10,00%	3.770,20	10,00%	3.770,20	10,00%	3.770,20	10,00%	3.770,20	10,00%		
3.0		LIMPEZA FINAL																					
3.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	13.920,00	1.392,00	10,00%	1.392,00	10,00%	1.392,00	10,00%	1.392,00	10,00%	1.392,00	10,00%	1.392,00	10,00%	1.392,00	10,00%	1.392,00	10,00%	1.392,00	10,00%		
SUB TOTAIS			219.398,86	22.632,76	10,32%	21.862,90	9,96%	21.862,90	9,96%	21.862,90	9,96%	21.862,90	9,96%	21.862,90	9,96%	21.862,90	9,96%	21.862,90	9,96%	21.862,90	9,96%		
TOTAL ACUMULADO				22.632,76	10,32%	44.495,66	20,28%	66.358,56	30,25%	88.221,46	40,21%	110.084,36	50,18%	131.947,26	60,14%	153.810,16	70,11%	175.673,06	80,07%	197.535,96	90,47%	219.398,86	100,00%

TOTAL	219.398,86
BDI 24,11%	52.897,07
TOTAL GERAL EM R\$	272.295,93

IMPORTA A PRESENTE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA NO VALOR DE R\$ 272.295,93

DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS



CORAL - Const. Rodvalho Alencar Ltda

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Eng. Civil - CRETA - CE 8588 - D
Responsável Técnico

CORAL - Const. Rodvalho Alencar Ltda.

Dirceu Teófilo - CREANCE 14628-F

**CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.**

AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85)-3261-0915
 CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 - CGF Nº 06.002.744-4
 CEP 69.170-251 - Aldeota - Fortaleza - Ceará

**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA****OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO****MUNICÍPIO: BARBALHA - CE****DATA: 05/05/2017****COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI**

Ordem	Item Componente do BDI	Sigla	Taxa(%)
1)	Garantia	G	0,20%
2)	Risco	R	0,56%
3)	Seguro	S	0,20%
4)	Despesas Financeiras	DF	1,11%
5)	Administração Central	AC	4,01%
6)	Lucro	L	3,31%
7)	Tributos	I	11,65%

Grupo A	Lucro	
L	Lucro Bruto	3,31%
Total do Grupo A(%) =		3,31%

Grupo B	Garantia e Despesas Indiretas	
S	Seguro de taxas	0,20%
R	Taxa de Riscos	0,56%
G	Garantia	0,20%
AC	Administração Central	4,01%
DF	Despesas financeiras	1,11%
Total do Grupo B(%) =		6,08%

Grupo C	Impostos/Tributos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,50%
	CPRB	4,50%
I		Total do Grupo C(%) = 11,65%

Fórmula de Cálculo do BDI

$$(((1+A/100) \times (1+B/100))/(1-C/100)) - 1) \times 100$$

TOTAL (%)	24,11%
------------------	---------------

CORAL - Const. Rodovalho Alencar Ltda.
 Eng.º Civil Igo Proença Alencar
 Diretor Técnico - CREA/CE 14626-R

CORAL - Const. Rodovalho Alencar Ltda.
 Paulo Adriano de Almeida Magalhães
 Eng.º CMI - CREA - CE 8966 - D
 Responsável Técnico



CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

AV. SEN. VIRGILIO TAVORA, 1701 - SALA 408 - FONE/FAX: (85) 3261.0915
 CNPJ 07.195.191/0001-33 - CGF 06.002.744-4
 CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - CE



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO

MUNICÍPIO: BARBALHA - CE

DATA: 05/05/2017

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS NA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA

COD.	DESCRIÇÃO	TABELA 024.1	
		HORISTA(%)	MENSALISTA(%)
GRUPO A			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-
B3	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA	46,45	17,71
GRUPO C			
C1	AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO-PRÉVIO TRABALHANDO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
C	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA	15,43	11,78
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO	0,53	0,41
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE OUTRO	8,33	3,39
GRUPO E			
E	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	-	-
TOTAL DO GRUPO E		-	-
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A+B +C+D + E)		87,01	49,68

CORAL - Const. Rodovalho Alencar Ltda.

Engº Civil Igo Proença Alencar
 Diretor Técnico - CREA/CE 14828-P

CORAL - Const. Rodovalho Alencar Ltda.

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
 Engº Civil - CREA - CE 8906 - D
 Responsável Técnico

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do representante da futura CONTRATADA, indicado para assinatura do Contrato:

NOME : Igo Proença Alencar

NACIONALIDADE : Brasileira

ESTADO CIVIL : Casado

PROFISSÃO : Diretor Técnico

RG : 96006001917

CPF : 806.191.503-00

DOMICÍLIO : Rua Eduardo Garcia, nº 650, apartamento 400, Aldeota

CIDADE : Fortaleza

UF : Ceará

TELEFONE : (85) 3261 0915

Fortaleza-CE, 05 de maio de 2017.

CORAL - Construtora Rodovalho Alencar Ltda.

Eng.º Civil Igo Proença Alencar
Diretor Técnico - CREA/CE 14828-P



realize
EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS



CARTA DE PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA – CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DESCLASSIFICADA

TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.04.18.1

Através da presente, declaramos inteira submissão aos ditames da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiada pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações e, as cláusulas e condições previstas no edital e seus anexos da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.04.18.1**.

Declaramos, ainda, que nos preços contidos na proposta inicial apresentada e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos e despesas, tais como: vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação, ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da proponente vencedora.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.S. a nossa proposta de preços para a execução das obras e serviços de engenharia objeto da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.04.18.1**, pelo valor global de: **R\$ 263.291,97 (duzentos e sessenta e três mil e duzentos e noventa e um reais e noventa e sete centavos)**, com prazo de execução de **09 (nove) meses**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.04.18.1** nos comprometemos a assinar o termo de contrato no prazo determinado no instrumento de convocação indicando para esse fim o Senhor (a) Ana Maria Batista dos Santos, portador(a) da carteira de identidade Nº 47699182 expedida pelo SSP/CE e inscrito(a) no CPF nº 276.306.843-04, residente à Rua Boa Vista Nº 340 – Centro, na cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, CEP:63.010-127, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta de preços será de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega dos envelopes indicados sob as letras “A” e “B”, contendo respectivamente as Documentações de Habilitação e Proposta de Preços.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação bem como seus anexos.

PROPONENTE: ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS – ME
ENDEREÇO: RUA BOA VISTA Nº 340, LETRA A - CENTRO - JUAZEIRO DO NORTE/CE, CEP: 63.010-127
CNPJ Nº 24.654.099/0001-03
Nº DA CONTA CORRENTE: 18.621-X – AGÊNCIA: 2597-6

Atenciosamente,

Juazeiro do Norte - CE, 03 de maio de 2017.

Ana Maria Batista dos Santos

24.654.099/0001-03
REALIZE EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS-ME
ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS-ME
Rua: Boa Vista, 340
CENTRO - CEP: 63.010-127
Juazeiro do Norte - CE

Igor Vicente Silva
IGOR VICENTE SILVA
CREA Nº 52791/CE / RNP: 061285781-6
ENGENHEIRO CIVIL

[Handwritten signatures]

ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME
Rua Boa Vista, 340 "A" Centro - Juazeiro do Norte - CE - Fone: (88) 99835-3007
Cep: 63.010-127 - CNPJ: 24.654.099/0001-03 - E-mail :realize.servicos@bol.com.br
